

# 施工実績

発注者 箕輪町役場 H20町単独側溝改修工事 平成21年2月4日 施工  
 工事箇所 箕輪町松島町道5号線 JR飯田線長岡踏切 平成21年2月5日 2日間  
 施工規模 固定式オールグレーチングタイプ500型 L=12.0m 既設...現場打ち横断水路

着手前 → 2日後(施工時間 8:30~17:00) 一完成



既設側溝上部横断面切断状況



コントローラによる操作状況

既設側溝上部横断面切断状況

## 施工状況




側溝上部補強金具設置




側溝上部補強金具設置  
(調整間詰めコンクリート打設前)

間詰めコンクリート 注入

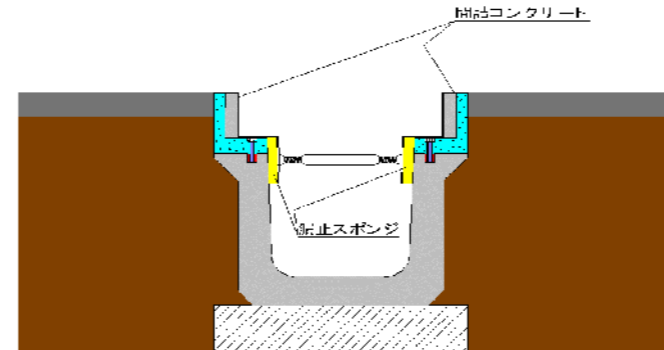

調整間詰めコンクリート打設完了  
(速硬化無収縮モルタル)

すり付け舗装(必要により)

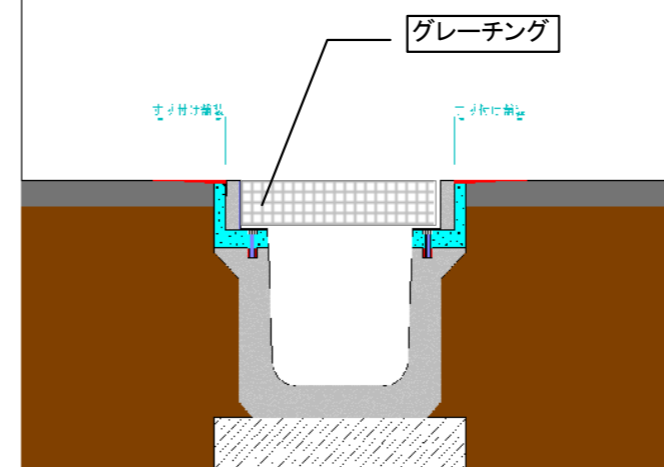

固定式グレーチング設置および  
すり付け特殊弾性舗装完了
